

clase teorica 5/9/2025 [meles]

repaso

Proyecto

- instancia de un proceso
- fecha inicio y fin
- tiene resultado unico

Diferencia entre proceso definido y empiricos

Empiricos: equipo define los cambios que necesita hacer al proceso

Definidos: organizacionales y para cambiar necesitas una evaluacion y autorizacion de quieenes trabajan dentro dela organizacion definiendo procesos.

Entradas identificadas / Salidas esperadas.

Clase - Componentes de Proyecto de Software

Definicion de un proceso de software

Los procesos empiricos son compatibles con ciclos de vida iterativos.

Los proyectos son unicos.

Ciclos de vida

Rapid Develoment Mcconell - Capitulo 7

| planning is everything, plans are nothing

Que es la administracion de proyectos?


- Gestion del proyecto

- Planificación
- Seguimiento y supervisión

No se puede hacer seguimiento si no hay plan. Lo que a veces pasa es que a veces a esos planes no se los tiene en cuenta o no se hace seguimiento.

Tres variables principales para jugar, equilibrar. Se la conoce como la Triple Restricción o the triple constrain

- Objetivos de proyecto : que esta el proyecto tratando de alcanzar?
 - esto depende mas que nada del cliente
- Tiempo: cuanto tiempo deberia llevar completarlo?
- Costo o recursos: cuanto deberia costar?

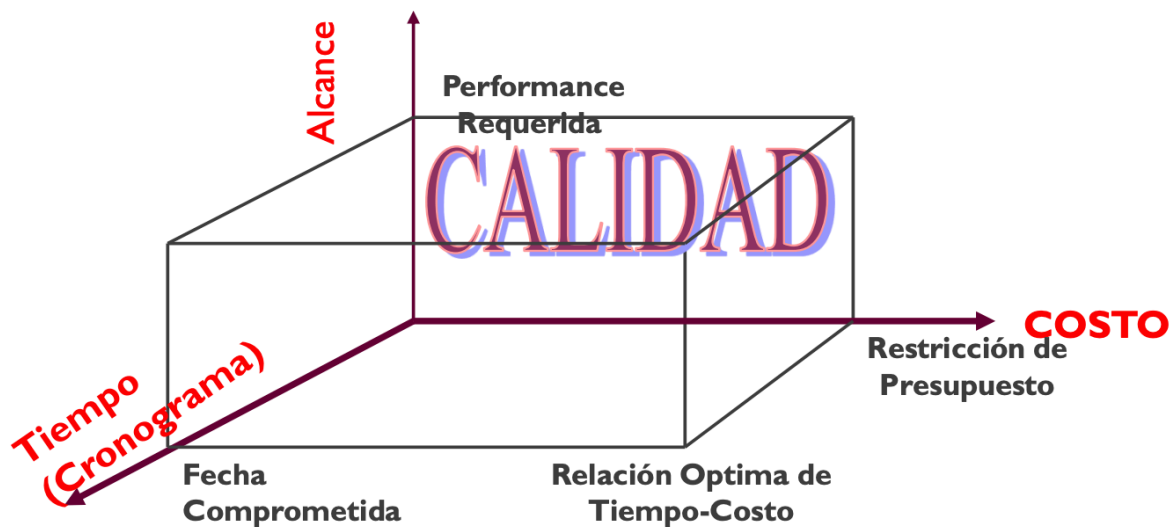

El problema de un proyecto basado en requerimientos fijos, no hay flexibilidad que esto que esta fijo, por consecuencia vas a tener que recalcular todo lo definido

En el product backlog se anotan las características que se planifican para el producto. El PO puede agregar o quitar requerimientos.

El enfoque tradicional tiene:

- fijo
 - alcance
- variable
 - tiempo
 - recursos/costos

El enfoque agil, al contrario tiene:

- fijo
 - tiempo
 - recursos/costos
- variable
- alcance

Tener flexibilidad para blanquear la situacion.

Nota: Dentro de los ciclos iterativos hay 2 tipos:

- ciclo de vida de alcance fijo
 - significa q no entrego hasta que termine de desarrollar todas las características que me comprometi
- ciclo de vida de duracion fija

rol de lider de proyecto/equipo

Asignacion diferida:

Plan de proyecto

Mas definido que un roadmap, el roadmap es mas general.

El plan de proyecto documenta:

- Que hacemos?
- Cuando?
- Como lo hacemos?
- Quien lo va hacer?

Que implica la planificacion de proy de sw?

- Definicion del objetivo del proyecto

Un objetivo debe tener dos características:

- Claro: vision compartida, todos entendemos lo mismo
- Alcanzable: saber que se puede realizar

Definicion del alcance

Alcance del producto: características que pueden incluirse en un producto o servicio

Alcance del proyecto: Es todo el trabajo y solo el trabajo q hay q hacer para entregar el producto con todas las características y funciones especificadas.

Estimaciones

- En procesos definidos
 - Estima el lider de proyecto o quien el define como experto.
 - Foco **precision**
- En procesos agiles
 - Estima el que toma la tarea y es relativa.
 - Foco **certeza**

Estimaciones en procesos definidos

- tamaño
 - que es lo que tengo que hacer? que queremos construir
 - en que estimamos tamaño
 - contamos requerimientos, o casos de uso por complejidad
- esfuerzo
 - como?
 - hora/personas/lineales
 - asumo que va trabajar una sola persona trabajando una cosa por vez
 - no tiene en cuenta distracciones
- calendario/tiempo
 - cuando?
 - del tiempo de trabajo, cuantas horas reales se trabaja? generalmente son 5, 5h y media de un trabajo de 8hs
- costo
 - cuanto?
 - se deriva del tiempo estimado
- recursos criticos (opcional)

Riesgos

Riesgo: probabilidad de ocurrencia o existencia de un impacto negativo o daño en el sistema, incluso que puede afectar el alcance del objetivo. Siempre se relaciona con la probabilidad, igual que las estimaciones.

Exposicion de riesgos

- probabilidad: que certeza tenemos de que esto se presente.
- impacto: cuanto daño.

Contingencia: que haces si el riesgo sucedio.

Gestion proactiva del riesgo

Metricas del software

Seguimiento del plan

Forma cuantitativa de control: visibilidad objetiva sobre la situacion del proyecto.

Metrica es un **numero**.

- De proceso
- De proyecto
- De producto

Metricas basicas

- tamaño de producto
- esfuerzo [proyecto]
- tiempo (calendario) [proyecto]
- defectos [producto]

las metricas no miden personas. la calidad del producto no se relaciona al bolsillo.
no se premia ni se castiga con esto.

